
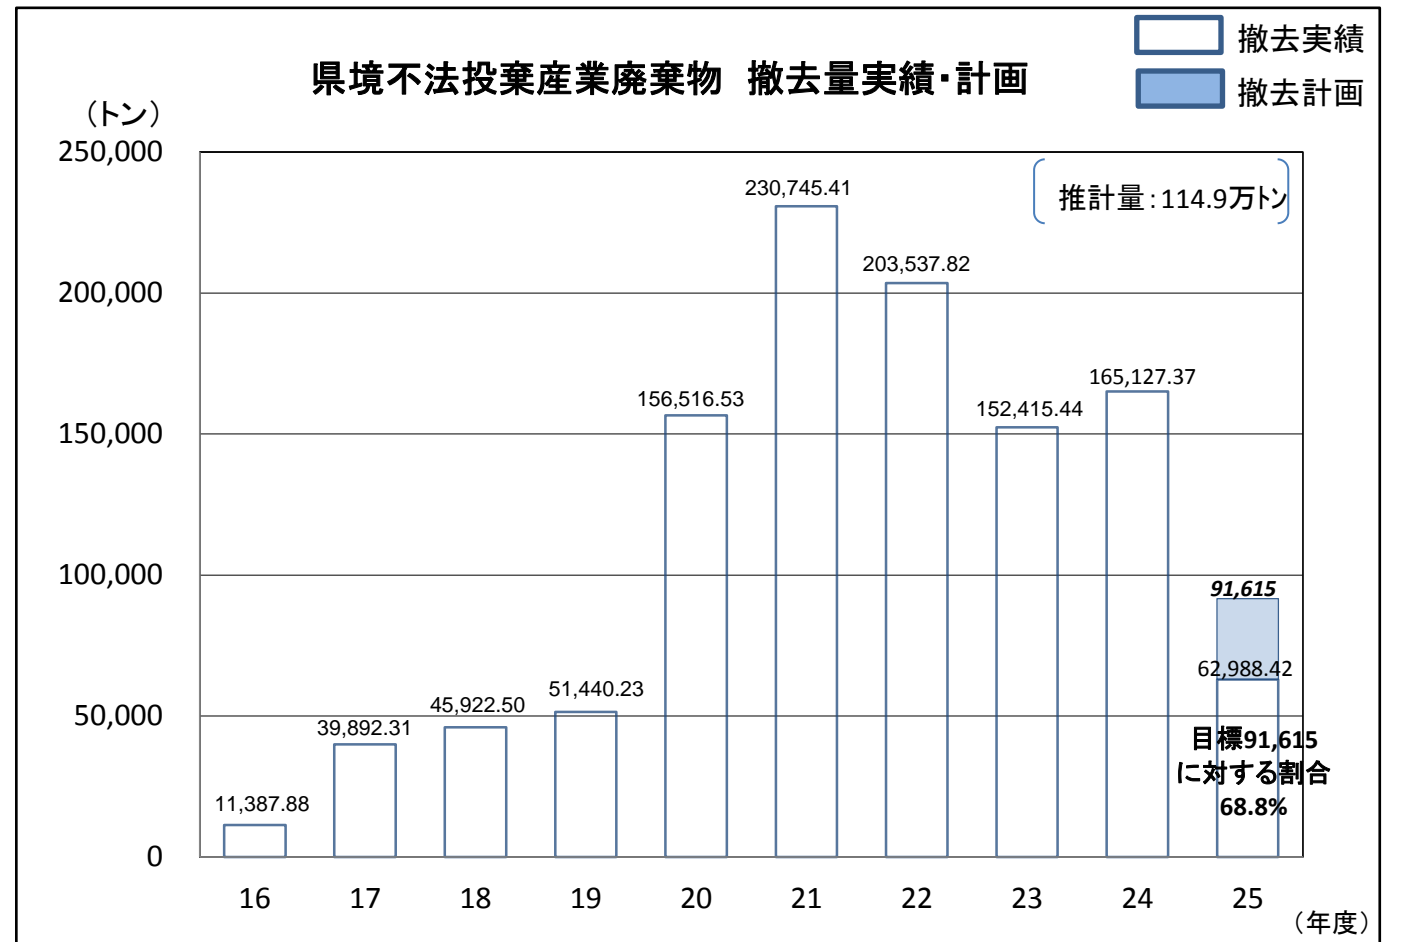


廃棄物等の撤去実績(平成25年8月23日現在)

(単位:トン)

区分	平成16~23年度	平成24年度実績	小計(平成16~24年度)	平成25年4月~8月23日	累計	
作業日数	1,609	236	1,845	92	1,937	
台数	77,179	13,876	91,055	5,192	96,247	
撤去実績	891,858.12	165,127.37	1,056,985.49	62,988.42	1,119,973.91	
処理方法別	埋立処理量	383,578.98	90,643.44	474,222.42	31,009.53	505,231.95
	焼却処理量	507,943.01	74,436.55	582,379.56	31,978.89	614,358.45
	その他(破碎処理量)	336.13	47.38	383.51		383.51

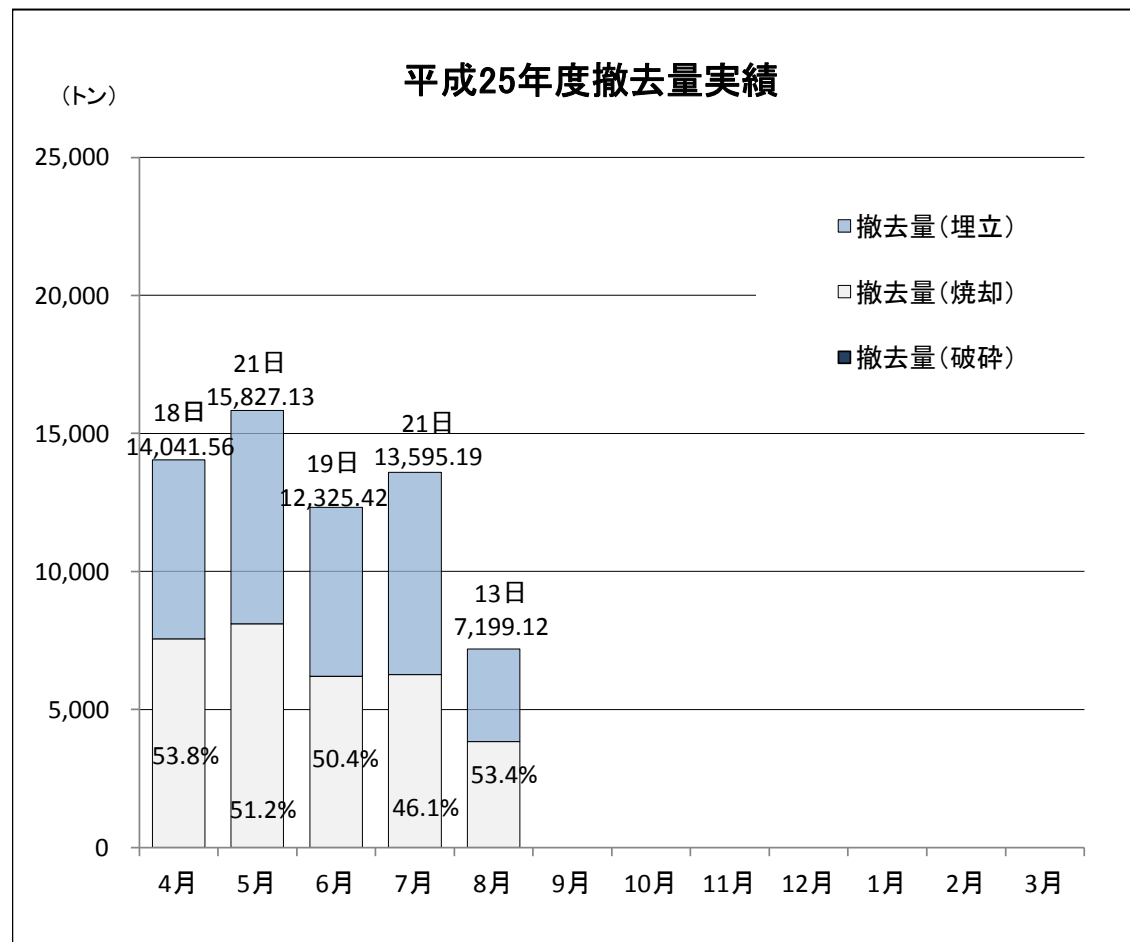

平成25年度廃棄物等撤去計画(8月19日時点)

廃棄物等撤去進捗状況(平成25年8月19日時点)

(単位:千t)

区分	全体推計量 【H24.10推計】	実績	進捗率[%]
平成24年度まで	1,057	1,057	-
平成25年度	92	61	66
合計	1,149	1,118	97

平成25年度地山確認予定(平成25年8月19日時点)

地山確認回	地山確認時期	面積[m ²]	進捗率[%]
第1回～第9回	平成21年6月～平成24年12月	49,900	60
第10回	平成25年4月24日	10,500	73
第11回	平成25年7月1日	11,300	86
第12回 (西側エリア、選別施設南側、洗車場西側)	平成25年9月20日	11,200	100
合計		82,900	

凡例(汚染土壌)

- 地山汚染深度 1m
- 地山汚染深度 2m
- 地山汚染深度 3m

