

令和6年度 青森県財務部優良工事表彰

工事の概要

工事名	七戸庁舎空調和設備改修工事		
受注者名	有限会社日の出設備工業		
工事場所	上北郡七戸町字蛇坂地内	請負金額	17,589,000円
工期	令和5年10月19日～令和6年3月19日	成績評定点	82点
完成年月日	令和6年3月19日	推薦公所	財産管理課
主任（監理）技術者	天間 智恵子	総括監督員	安宅 孝紀
工事内容	空調和設備工事 一式 電力設備工事 一式	主任監督員	内村 伸一郎
		監督員	田中 祐多

推薦理由

本工事は、竣工当初から冷房設備が整備されていない七戸庁舎の夏季における執務環境改善を目的として、空調和設備及び付随する電力設備を整備したものである。

施設利用者への影響を最小限に抑えて施工することが必要となるため、施設管理者との調整を綿密に行い、機器の取付や停電作業を施設閉庁日に行う等、施設への影響に配慮した工程管理に努めた。また、品質の向上を図るため各施工段階における社内検査を都度行ったほか、耐震性能を考慮したアンカーボルトの埋込深さの確認を全数実施、機器据付後の試運転調整時間を多く設けるため効率的に作業を進めて行くなど、品質管理の取り組みが優れていた。

以上のことから、工程管理及び品質管理に優れており、他の模範とするべく青森県財務部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



外部配管状況



設置状況



電気工事状況

受賞コメント

この度は青森県財務部優良工事表彰を賜り、誠にありがとうございます。

受賞にあたり、ご指導いただきました監督職員の皆様、本工事へのご理解とご協力いただきました七戸庁舎職員の皆様、協力会社作業員の皆様に心より感謝申し上げます。

今後も地域社会の発展に貢献できるよう社員一同努力してまいります。



代表取締役
十枝内 康夫



主任技術者
天間 智恵子

令和6年度 青森県財務部優良工事表彰

工事の概要

工事名	自治研修所電気設備改修工事		
受注者名	藤林電気株式会社		
工事場所	青森市東造道一丁目地内	請負金額	19,481,000円
工期	令和5年9月6日から令和6年3月21日	成績評定点	82点
完成年月日	令和6年3月21日	推薦公所	財産管理課
主任（監理）技術者	赤坂 勝	総括監督員	安宅 孝紀
工事内容	電力設備工事 一式 通信・情報設備工事 一式	主任監督員	内村 伸一郎
		監督員	吉田 公典

推薦理由

本工事は施設の長寿命化を目的として、老朽化した動力盤、電灯分電盤、端子盤、拡声設備及び自動火災報知設備を更新するものである。

盤類や電線類の資材需給に問題が生じている社会情勢に見舞われながらも、施設管理者の要望である「12月後半の研修時期終了後の工事現場着手」に協力するため、綿密な打合せや現場調査、各方面とのスケジュール調整に取り組み、余裕を持って工事完成させるなど優れた工程管理だった。また、現場作業日数が限られている中、設計に含まれていない端子盤の更新提案や、盤撤去後の床下地の修復方法を複数提案し施設側へも情報提供するなど、受注者が持つ豊富な経験で課題を解決し発注者が要求する性能・品質を満足させるものであった。

以上、「困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、青森県財務部優良工事に推薦するものである。


工事写真等



動力盤



電灯分電盤

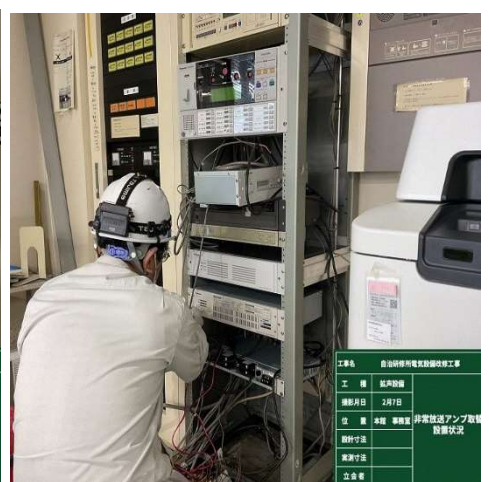

拡声設備及び自動火災報知設備

受賞コメント

この度は、令和6年度青森県財務部優良工事表彰を賜り、誠にありがとうございます。受賞にあたり御指導頂いた監督職員の皆様、ご協力頂きました関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

本工事は、施設管理者の要望で研修期間終了後の1月初旬より工事着手いたしました。そのため、現場作業日数は多くありませんでしたが、工事着手前の綿密な現場調査や関係者と十分な打ち合わせを行ったため、工事が円滑に進み無事に竣工させることができました。

今回の受賞を励みとし、更なる施工技術、品質向上を目指し努力して参りたいと思います。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。



代表取締役社長
藤林 健太



主任技術者
赤坂 勝

令和6年度 青森県財務部優良工事表彰

工事の概要

工事名	三沢航空科学館中央監視制御設備改修工事		
受注者名	桜田設備工業株式会社		
工事場所	三沢市大字三沢字北山地内	請負金額	84,150,000円
工期	令和5年6月1日～令和6年3月13日	成績評定点	81点
完成年月日	令和6年2月5日	推薦公所	財産管理課
主任（監理）技術者	折田 智樹	総括監督員	安宍 孝紀
工事内容	自動制御設備工事 一式	主任監督員	内村 伸一郎
		監督員	小鹿 孝太郎

推薦理由

本工事は三沢航空科学館の中央監視制御設備の改修を行うものである。
監視制御機器類が全般的に長納期化している中、納期の早い機器から複数回に分けて順次搬入・据付を行ったほか、展示スペースの検出器更新の際には施設管理者と綿密に調整するなど、施設運営への影響を最小限に抑えつつ工期末までに余裕を持って工事を完成させた。
また、更新した中央監視装置の操作方法を施設管理者に入念に説明し、操作方法について施設管理者から問合せがあった際には迅速に対応した。
以上、工程管理、施設運営への配慮等が優れており、「困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、青森県財務部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



更新機器



更新機器



工事状況

受賞コメント

この度は、栄誉ある青森県財務部優良工事表彰を賜りまして誠にありがとうございます。

ご指導を頂きました監督職員の皆様、ご協力を頂いた関係各位の皆様には心から感謝とお礼を申し上げます。

厳しい機器納期と運営中の施設での機器更新でしたが、施設管理者の皆様及び協力業者の皆様との綿密な工程打合せ等により施設運営には支障なく無事に竣工することができました。

今回の受賞を励みに、安全管理及び工程管理の徹底と更なる品質・技術力の向上に努め、地域社会の発展に貢献できるよう努力して参りますので、今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。



代表取締役
桜田 喜美穂



監理技術者
折田 智樹

令和6年度 青森県財務部優良工事表彰

工事の概要

工事名	森田養護学校（特別教室棟2・3）大規模改修機械設備工事		
受注者名	株式会社共同設備		
工事場所	つがる市森田町床舞鶴喰地内	請負金額	27,753,000円
工期	令和5年6月16日から令和6年2月29日	成績評定点	81点
完成年月日	令和6年2月29日	推薦公所	財産管理課
主任（監理）技術者	小山内 次男	総括監督員	安宅 孝紀
工事内容	空調設備工事 一式 自動制御設備工事 一式 給排水衛生設備工事 一式	主任監督員	内村 伸一郎
		監督員	吉田 公典

推薦理由

本工事は森田養護学校の特別教室棟において、老朽化対策と間取りの変更・室の転用を行う事を目的として、空調設備、自動制御設備、給排水衛生設備を更新するものである。

給排水配管工事において、設計図と既存設備の相違や狭隘なパイプシャフト内の配管施工など、困難な状況が続いたが、関連工事と連携をとりつつ、時にはリーダーシップを発揮しながら工事全体の進捗に大きく貢献した。

また、教室内手洗器を別教室に変更する依頼があった際には、設置場所選定の為の配管調査を積極的に行い、学校側の要望も汲み入れながら最適な設置教室を提案するなど真摯に対応した。これら施工条件の変更等が多数ありながらも、学校側の部分使用の要望に合わせて各エリアの施工を期限内に完了させた。

以上、「困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、青森県財務部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



エアコン室内機



手洗器（各教室内）



2階WC 衛生器具

受賞コメント

この度は、青森県財務部優良工事表彰を受賞出来ました事、大変名誉ある賞を賜りました事はこの上ない喜びであり、深く感謝申し上げます。

御指導頂きました監督職員の皆様をはじめ、学校関係者の皆様並びに工事関係者の皆様のご理解と御協力があったからこそと感謝しているところであります。

この受賞を励みとして、建設業の社会的使命を認識し、一層の技術研さんに努め、地域の信頼と期待に応えられるよう品質と技術を重んじる企業として、社会に貢献していきたいと考えておりますので、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。



代表取締役
澁谷 久人



担当技能者
長谷川 淳

令和6年度 青森県財務部優良工事表彰

工事の概要

工事名	森田養護学校（特別教室棟2・3）大規模改修電気設備工事		
受注者名	有限会社技電		
工事場所	つがる市森田町床舞鶴喰地内	請負金額	18,887,000円
工期	令和5年6月15日から令和6年2月29日	成績評定点	81点
完成年月日	令和6年2月29日	推薦公所	財産管理課
主任（監理）技術者	下山 泰治	総括監督員	安穴 孝紀
工事内容	電力設備工事 一式 通信・情報設備工事 一式	主任監督員	内村 伸一郎
		監督員	吉田 公典

推薦理由

本工事は森田養護学校の特別教室棟において、老朽化対策と間取りの変更・室の転用を行う事を目的として、電力設備、通信・情報設備を更新するものである。

盤類や電線類の資材需給に問題が生じている社会情勢に見舞われながらも、学校側の部分使用の要望に合わせて各エリアの施工を完了させた。またその過程において、設計図通りの施工が困難な動力幹線ルートについて、丹念な現場調査により代替案を素早く提示したり、自動火災報知設備の消防検査に臨む際、不足していた施設全体の消防設備図を作成するなど、工事進捗に顕著な成果をあげた。

以上、「困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、青森県財務部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



動力幹線（現場調査）



動力幹線（埋設ルート）



各教室LED照明に更新

受賞コメント

この度は、青森県財務部優良工事表彰を賜り、誠にありがとうございます。ご指導頂きました監督員の皆様、関係各位の皆様にご心から感謝とお礼を申し上げます。

本工事は運営中の学校という事で、学校生徒への怪我及び勉強の妨げにならない事を念頭に綿密な施工計画を行い充分な打合せの元、無事故無災害で引渡しをすることが出来ました。

今回頂きました受賞を励みとし、これからも地域の皆様にご満足頂ける品質を提供できるよう精進して参りますので、ご指導ご鞭撻の程宜しくお願い致します。



代表取締役
加藤 祐



主任技術者
下山 泰治

令和6年度 青森県財務部優良工事表彰

工事の概要

工事名	総合学校教育センター大研修室電気設備改修工事		
受注者名	株式会社電路施設社		
工事場所	青森市大字大矢沢字野田地内	請負金額	109,637,000円
工期	令和5年6月8日から令和6年3月22日	成績評定点	81
完成年月日	令和6年3月19日	推薦公所	財産管理課
主任（監理）技術者	工藤 義信	総括監督員	安宍 孝紀
工事内容	電力設備工事 一式 通信・情報設備工事 一式 舞台機構設備工事 一式	主任監督員	内村 伸一郎
		監督員	川口 弘暉

推薦理由

本工事は竣工後25年が経過し、経年劣化による不具合が生じている大研修室の電気設備を更新するものである。盤類や配線器具の資材需給に問題が生じている社会情勢に見舞われながらも、施設管理者の要望である「10月後半の研修終了後の工事現場着手」に協力するため、各方面とのスケジュール調整に取り組み、余裕を持って工事を完成させた。

また、更新機器の使用方法を施設管理者から聞き取り、提案をもって利便性向上に努めたことや狭小な天井裏キャットウォーク空間の機器点検時の安全に配慮した提案と施工を行ったことにより、施工に満足のいくものだった。

以上、「困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、青森県財務部優良工事に推薦するものである。


工事写真等



LED制御盤



AV機器架

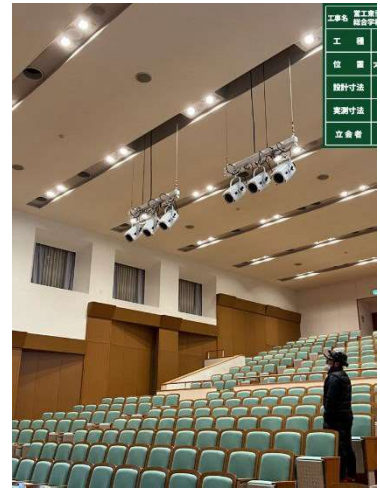

演出照明

受賞コメント

この度は、青森県財務部優良工事表彰を賜り、誠にありがとうございます。
このような名誉ある賞を賜り、大変光栄に存じます。
受賞にあたりましては、お忙しい中ご指導くださいました監督職員の皆様、ご不便をおかけした総合学校教育センターの職員の皆様、並びにご協力くださいました工事関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。
本工事では、施設利用者の使いやすさが重要と考え要望を伺い、こちらから、その先を見据えた提案をし工事に臨みました。
結果、皆様のおかげで事故もなく無事工期内に終わることができました。
これからも今回の受賞を励みとし、弊社のモットーである『確実な設計・施工』『誠実なアフターサービス』のもと、より一層品質と技術の向上を目指して参りますので、ご指導ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。



代表取締役
網野 正敏



監理技術者
工藤 義信
