公　　告

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 88 条第 1 項の規定により、県営土地改良事業（あしげ堤地区ため池等整備事業（ため池整備）（防災重点型））計画を変更するため、変更後の同計画の概要につき平川市長と協議するので、同条第 6 項において準用する同法第 87 条の 2 第 8 項の規定により公告し、次のとおり縦覧に供する。

この計画の概要に意見がある者は、令和 8 年 12 月 14 日までに意見書を提出することができる。

令和 8 年 11 月 25 日

青森県知事　宮下　宗一郎

記

1　縦覧に供する書類

土地改良事業計画概要書

2　縦覧の期間

令和 8 年 11 月 25 日から同年 12 月 14 日まで

3　縦覧に供する書類及びこの公告文の掲載場所

青森県庁ウェブサイト

（ https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/noson/kanri_01.html ）

4　意見書の提出方法等

(1) 意見書は、郵送又は電子メールにより提出すること。

(2) 意見書の提出先

青森県 農林水産部 農村整備課

ア　郵送の場合　〒030-8570　青森市長島 1 － 1 － 1

イ　電子メールの場合　noson@pref.aomori.lg.jp

（添付ファイルによる場合は、テキスト形式によること。）

(3) 意見書には、①事業名、②地区名、③意見書の提出者の氏名及び住所（団体の場合は名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地）並びに④連絡先（電話番号及びメールアドレス又はそのいずれか）を記載すること。

(4) 提出のあった意見は、公表する場合があるため留意すること。

(5) 意見書に使用する言語は、日本語とすること。

計画変更を必要とする理由

ため池等整備事業（ため池整備）（防災重点型）

【第１回変更】

県　　名：青　　森　　県
地 区 名：あ　し　げ　堤
所 在 地：平　　川　　市
事業主体：青　　森　　県

1　変更の内容

（1）事業費

（単位：千円）

区　分	事業費		増減	増減内容			
	変更前	変更後		自然増	工法変更	事業量変更	その他
純工事費	207,300	73,170	-134,130	38,900	-172,030	-1,000	0
ため池改修工	207,300	73,170	-134,130	38,900	-172,030	-1,000	0
測量設計費	26,700	21,604	-5,096	500	0	0	-5,596
用地買収補償費	3,000	5,826	2,826	0	6,800	-3,974	0
工事費	237,000	100,600	-136,400	39,400	-165,230	-4,974	-5,596
事務的経費	11,850	5,030	-6,820	1,970	-8,262	-249	-280
合　計	248,850	105,630	-143,220	41,370	-173,492	-5,223	-5,876

（2）地区面積

（単位：ha）

区　分	変更前	編入	除外	計
農用地	2.5	-	-	2.5
非農用地	-	-	-	-
公有地	-	-	-	-
特定用途	-	-	-	-
合　計	2.5	-	-	2.5

（3）主要工事計画

区　分	変更前	変更後	備　考
受益面積	A=2.5ha	A=2.5ha	
主要工事計画			
堤体	N=1式	N=1式	
工期	令和４年～令和７年	令和４年～令和８年	
総費用	284,963千円	110,472千円	
総便益費	315,670千円	377,969千円	
総費用総便益費	1.10	3.42	

当初は全面改修工法とし、堤体に改良材を混ぜて盛土する予定だったが、実施設計において地質の再調査及び耐震対策工法の見直しをした結果、比較的安価な補強盛土工法の方が適していることが判明した。

これらにより、事業費が減となった。

2　変更する理由

（１）事業費（10%以上増減）　　**該当する**

$$\frac{\text{変更後事業費} - (\text{変更前確定事業費} + \text{自然増})}{\text{変更前確定事業費}} \times 100 = \text{変動率}$$

$$\frac{105{,}630 - (248{,}850 + 41{,}370)}{248{,}850} \times 100 = -74.2\%$$

（２）地区面積（10%以上増減）　　該当しない

0.0ha ／ 2.5ha ＝ 0.0%

（３）主要工事計画（10%以上増減）　　該当しない

ア　改修工

０式 ／ １式 ＝ 0.0%

以上のとおり、事業費の変動率が10%を超えるため、重要な変更となる。

土地改良事業計画概要書

ため池等整備事業（ため池整備）（防災重点型）

【第１回変更】

県　　名：　青　　森　　県
地 区 名：　あ　し　げ　堤
所 在 地：　平　　川　　市
事業主体：　青　　森　　県

目　　次

第１章　　目　　的 ---------- 1
　第１節　目　　的 ---------- 1
　第２節　地　　積 ---------- 1
第２章　　地域の所在及び現況 ---------- 1
　第１節　地域の所在及び地形 ---------- 1
　第２節　土質及び土壌 ---------- 1
　第３節　気　　象 ---------- 1
　第４節　水　利　状　況 ---------- 2
　第５節　道　路　状　況 ---------- 2
　第６節　営　農　状　況 ---------- 2
　第７節　地域環境の概況 ---------- 2
第３章　　基本計画 ---------- 2
　第１節　事業計画の要旨 ---------- 2
　第２節　営農計画及び土地利用計画 ---------- 3
　第３節　用　水　計　画 ---------- 3
　第４節　排　水　計　画 ---------- 3
　第５節　道　路　計　画 ---------- 3
　第６節　農用地造成計画 ---------- 3
　第７節　洪水調節計画 ---------- 3
　第８節　干　拓　計　画 ---------- 3
　第９節　農用地整備計画 ---------- 3
　第10節　老朽ため池改修計画 ---------- 3
第４章　　工事又は管理の要領 ---------- 4
　第１節　主要工事計画 ---------- 4
　第２節　工事の施行方法 ---------- 4
　第３節　工事完了後の施設の管理 ---------- 4
第５章　　換地計画の要領 ---------- 4
第６章　　費用の概算 ---------- 4
第７章　　効　用 ---------- 4
第８章　　他の事業との関連 ---------- 4
第９章　　計画概要図 ---------- 4

第１章　　目　　的

第１節　目　　的

防災重点農業用ため池に指定されているあしげ堤は、平川市西部に位置し、受益地2.5haの水田にかんがい用水を供給する農業水利施設として、地域営農において重要な役割を果たしている。

本ため池の詳細調査を行ったところ、地震時の堤体安全率が許容値を下回っており、今後、地震等による施設の損壊により、下流の農地や住宅等に被害が生じるおそれがあることが確認されたため、本事業により早急に堤体の耐震・豪雨対策を実施し、地域の防災機能の向上を図るものである。

第２節　地　　積

（単位：ha）

現況地目 / 市町村名	田	畑	原 野	山 林	その他	計	備　　考
平川市	2.5	-	-	-	-	2.5	

第２章　　地域の所在及び現況

第１節　地域の所在及び地形

本地区は、1/1000～1/100 程度の傾斜を呈しており、受益地標高は、60.8～66.5ｍである。

第２節　土質及び土壌

本地域の土質・土壌は、高根統 灰褐色土壌である。

第３節　気　　象

１．一般気象

観測所名	大鰐観測所	かんがい期	非かんがい期	計又は平均	備　　考	
観測期間	H23年～R6年	5月～9月	10月～4月			
平均気温（℃）		18.7	2.2	9.1		
降水量	平均（㎜）	616	697	1,313		
	基準年（㎜）	-	-	-		
降水日数	平均（日）	42	94	136		
	基準年（日）	-	-	-		
根雪期間		12月12日～3月28日		107 日間		
無霜期間		5月22日～10月5日		137 日間		
最多風向		S	最大風速（風向）	17 m/s（S）	最多風向発生時期　1月～12月	
					最大風速発生年月日	平成24年4月4日

２．特殊気象

観測所名　大鰐観測所

観測期間 S1年～R6年	第１位		第２位		第３位		第４位		第５位	
	数量	年月日	数量	年月日	数量	年月日	数量	年月日	数量	年月日
最大日雨量	217mm	H22.8.31	160mm	H25.9.16	148mm	S50.9.16	138mm	H16.9.30	134mm	S52.8.5
最大連続雨量	393mm	H14.8.4～H14.8.15	256mm	H23.9.17～H23.9.23	224mm	S56.8.29～S56.9.4	223mm	H22.8.30～H22.8.31	214mm	H25.9.15～H25.9.16
最大連続干天日数	36日	S48.6.24～S48.7.29	30日	S59.7.23～S59.8.21	27日	H20.9.4～H20.9.30	26日	H18.7.17～H18.8.17	26日	S59.5.10～S59.6.9

第４節　水　利　状　況

１．用水状況

本地区の用水は、あしげ堤から取水し、用水路より導水してかんがいしている。

２．排水状況

本地区の排水は、枇杷田川へ自然排水している。

３．改修を要する施設一覧表

項目／施設名	施設名又は箇所数	受益面積(ha)	構造	規模	新設年又は更新年	改修を必要とする理由	備考
ため池	あしげ堤	2.5	均一型	H=6.0m×L=120.0m V＝18.0千m^3	更新年 平成12年	機能低下	

４．想定被害状況

想定被害面積(ha)				想定被害額（千円）						備考
田	畑	その他	計	作物	農地	農業用施設	公共施設	一般部門	計	
3.6	-	2.8	6.4	195,838	43,374	3,039	253,632	96,142	592,025	

第５節　道　路　状　況

該当なし

第６節　営　農　状　況

本地区の営農は稲作を中心としている。

第７節　地域環境の概況

平川市は青森県南部の津軽平野の南端に位置し、東側は秋田県小坂町、十和田湖を境にした十和田市、西側は平川を隔てて弘前市、大鰐町、北側は青森市、黒石市、田舎館村と接している。

津軽平野の一部で水田地帯として利用される平坦地と、水稲とりんごの複合経営地帯である丘陵地、八甲田・十和田火山群の一部に属する山間地は国有林で占められている。

なお、本地域においては、特に配慮すべき貴重な動植物は確認されていない。

第３章　　基本計画

第１節　事業計画の要旨

１．要　旨

堤体下流側の基礎地盤改良、補強盛土を行うことで堤体の安定性を高め、防災機能の向上を図るものである。

２．事業別面積

（単位：ha）

土地利用区分／事業目的	水田	畑						計	備考
		普通畑	果樹園	牧草地	茶園	その他	小計		
用水改良	2.5	-	-	-	-	-	-	2.5	

第２節　営農計画及び土地利用計画

１．営農計画の概要

本事業の実施により災害を未然に防止し、農業経営の安定を図る。

２．土地利用区分

（単位：ha）

土地利用区分 / 区分	水 田	畑					小 計	原野	山林	その他	計	備　　考
		普通畑	牧草畑	果樹園	茶園	その他						
現　　況	2.5	-	-	-	-		2.5	-	-	-	2.5	
計　　画	2.5	-	-	-	-		2.5	-	-	-	2.5	

３．作付計画

田：水稲　　A＝2.5 ha

第３節　用水計画

該当なし

第４節　排水計画

該当なし

第５節　道路計画

該当なし

第６節　農用地造成計画

該当なし

第７節　洪水調節計画

該当なし

第８節　干拓計画

該当なし

第９節　農用地整備計画

該当なし

第10節　老朽ため池改修計画

１．洪水吐改修計画

該当なし

２．堤体補強計画

堤体下流側の基礎地盤改良、補強盛土を行う。

３．取水施設改修計画

該当なし

第４章　　工事又は管理の要領

第１節　主要工事計画

堤体　　Ｎ＝１式（均一型）

第２節　工事の施行方法

１．工事は、原則として請負施工で行う。

２．工事着手及び完了の予定時期

令和４年度　　着手予定
令和８年度　　完了予定

第３節　工事完了後の施設の管理

この事業で造成された施設は、平川市が管理する。

第５章　　換地計画の要領

該当なし

第６章　　費用の概算

工　事　費　　100,600　千円
事務的経費　　5,030　千円
事　業　費　　105,630　千円

第７章　　効　　用

（単位：千円）

効　果　区　分	年総効果（便益）額	増加見込所得額	備　　考
作 物 生 産 効 果	1,924	-	食料の安定供給の確保に関する効果
営農経費節減効果	△ 275	-	食料の安定供給の確保に関する効果
維持管理費節減効果	△ 1,492	-	食料の安定供給の確保に関する効果
災害防止効果(農業資産)	10,090	-	農業の持続的発展に関する効果
災害防止効果(一般資産)	4,028	-	農村の振興に関する効果
災害防止効果(公共資産)	10,627	-	多面的機能の発展に関する効果
国産農産物安定供給効果	383	-	その他の効果
計	25,285	-	令和７年度単価

＜ 参 考 ＞

総　　費　　用　：　110,472　千円
総　便　益　額　：　377,969　千円
総費用総便益比　：　377,969　÷　110,472　＝　3.42


第８章　　他の事業との関連

該当なし

第９章　　計画概要図

別紙添付図面のとおり（縮尺：1/25,000）

あしげ堤地区
ため池等整備事業（ため池整備）（防災重点型）
計画概要図　縮尺　1/25,000
所在地　青森県平川市新館地内

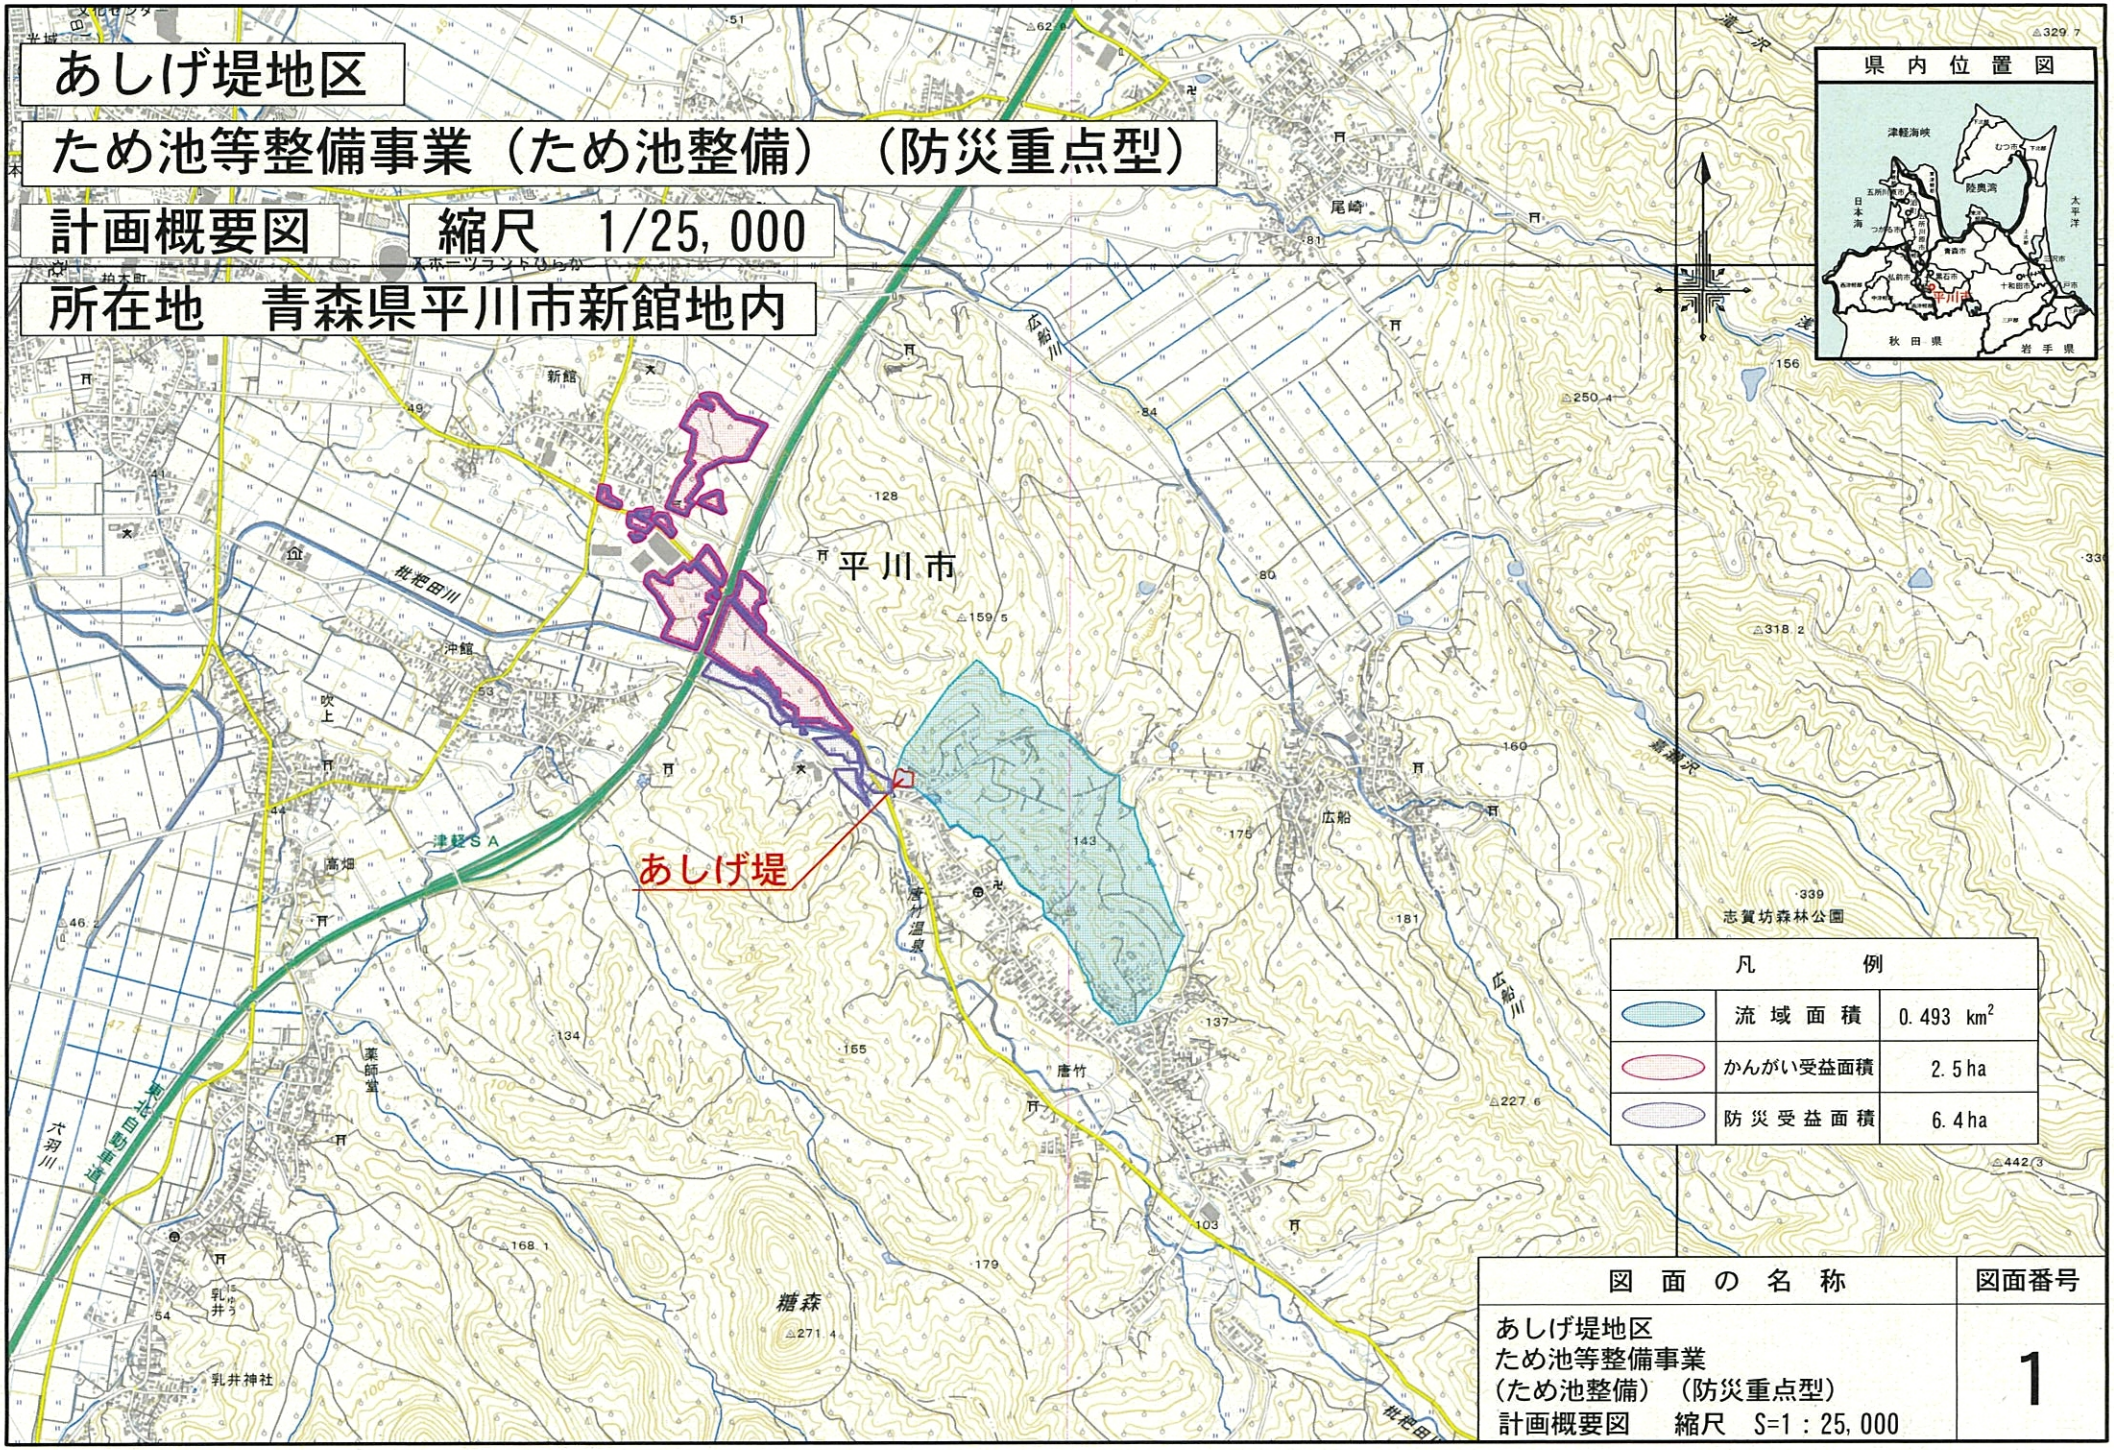

図面の名称	図面番号
あしげ堤地区 ため池等整備事業 （ため池整備）（防災重点型） 計画概要図　縮尺　S=1：25,000	1

予定管理方法等を記載した書面

ため池等整備事業（ため池整備）（防災重点型）

【第１回変更】

県　　名：　青　　森　　県
地 区 名：　あ　し　げ　堤
所 在 地：　平　　川　　市
事業主体：　青　　森　　県

県営あしげ堤地区ため池等整備事業（ため池整備）（防災重点型）によって改修された施設の予定管理方法

1．管　　理　　者

本事業によって造成された施設は、平川市が管理する。

2．管理すべき施設の種類

堤体　N＝ 1式（均一型）

3．管理に要する費用の概算及び負担の方法

（1）概算の費用

49　千円／年

（2）負担の方法

平川市が負担する。

事業費の負担区分の予定及び地元負担の予定基準を記載した書面

ため池等整備事業（ため池整備）（防災重点型）

【第１回変更】

県　　名：青　森　県
地区名：あしげ堤
所在地：平　川　市
事業主体：青　森　県

事業費の負担区分の予定及び地元負担の予定基準を記載した書面

１．事業費の負担区分

区　分		事業費	負担予定			
			国	県	市町村	受益者
工事費	負担予定率	% 100	% 55.0	% 34.0	% 11.0	% -
	負担予定額	千円 100,600	千円 55,330	千円 34,204	千円 11,066	千円 -
事務的経費	負担予定率	% 100	% -	% 100.00	% -	% -
	負担予定額	千円 5,030	千円 -	千円 5,030	千円 -	千円 -
合計	負担予定額	千円 105,630	千円 55,330	千円 39,234	千円 11,066	千円 -

２．地元負担金の負担方法

市町村負担金は、土地改良法第91条第6項の規定に基づき、平川市が負担する。

受益地域を記載した書面

ため池等整備事業（ため池整備）（防災重点型）

【第１回変更】

県　　名：青　森　県
地区名：あしげ堤
所在地：平　川　市
事業主体：青　森　県

受益地域を記載した書面

市　町　村	大　字	字	地　域								
平　川　市	新　館	駒　泊	2-2	2-4	3-2	12-1					
									字計	4	筆
		東　山	18	19-2	20-1	20-2	21	27	47-10	47-11	47-12
			57-1	62-1	66-1	69-1	69-3	88-1	88-3	89-1	90
			102-1	103-3	103-4	103-6	113-1				
									字計	23	筆
		藤　巻	60-2	61-1	80-1						
									字計	3	筆
		柏　崎	16	20-3	26-1	51-2	51-3				
									字計	5	筆
									合計	35	筆
